





NINDYA

**PT Nindya Karya (Persero)
General Contractor**


SIMCC 1.0 (Cost Control)

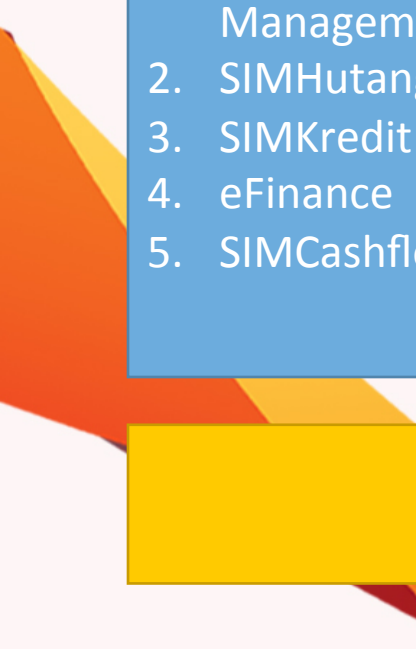



SIMPENGADAAN

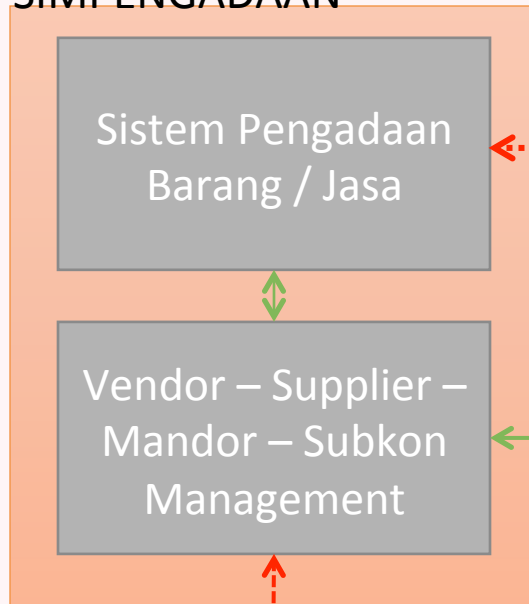

SIMCC

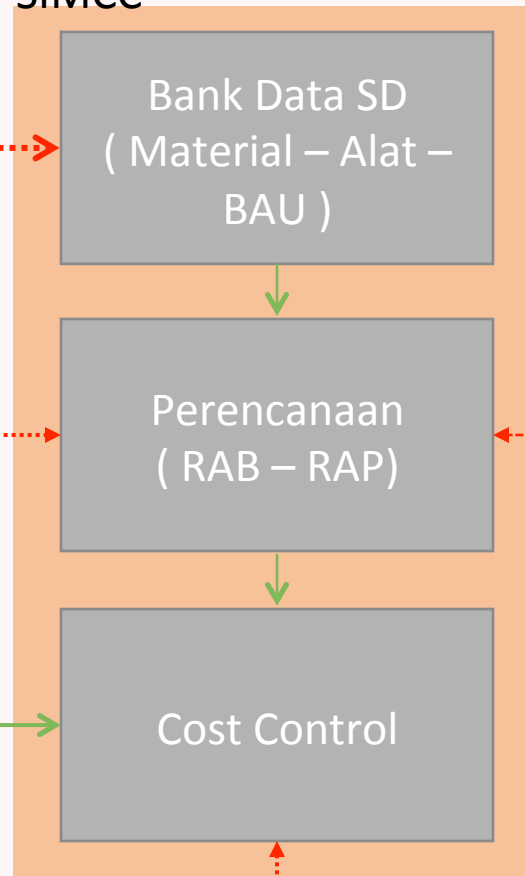

SIMASSET

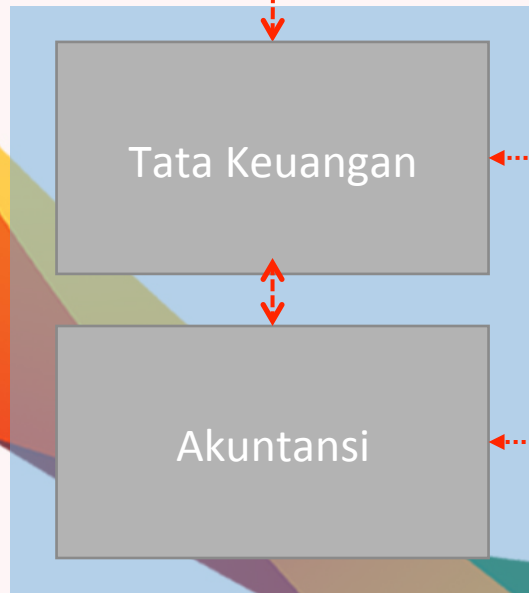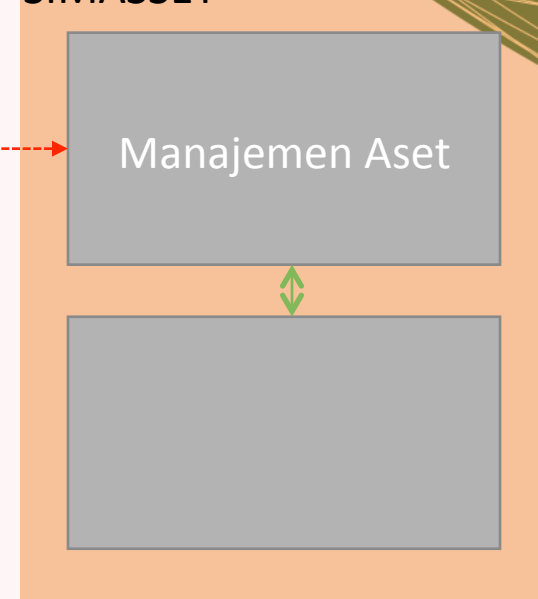

Keterangan :
 2. Sudah terintegrasi
 3. Tahap Berikutnya



SIMCC (Cost Control)

- Wajib CC adalah Proyek NON JO dan JO sebagai Leader (per September 2016)
- RBK yang diinput di SIMCC harus RBK yang telah ditetapkan
- Pelaporan 2 mingguan (YYxx , YY = tahun, xx = periode 01/02)
 - Periode pelaporan :
 - 01 = 26 bulan sebelumnya sd 10 bulan ini
 - 02 = 11 bulan ini sd 25 bulan ini
 - Seperti contoh : 1603 = tahun 2016, periode ganjil 01 untuk periode tgl 26 januari 2016 – 10 februari 2016)
- Transaksi yang diinput Adalah transaksi yang :
 - 1 biaya yang sudah
 - 2..
- Periode yang sudah diinput tidak bisa di rubah kembali
- Item baru dan perubahan (seperti tambah kurang pekerjaan, dll) dilakukan oleh cost control wilayah/Divisi atas permintaan proyek

SIMCC (Cost Control)


- SIMCC
 - Versi Online <http://simnk.nindyakarya.co.id>
 - Versi Offline –progress (80%)
 - Versi Android --progress (60%)
- Terintegrasi secara login dan database dengan seluruh SIMNK
 - Seluruh user harus terdaftar di SIMSDM, jika belum terdaftar menghubungi bagian SDM wilayah untuk berkoordinasi dengan SDM Pusat untuk dibuatkan akun SIMSDM
 - Bank Data Vendor / Supplier / Mandor / Subkon terintegrasi (SimPengadaan)
 - Dilarang memberikan username password dengan bawahan atau rekan kerja karena sudah terintegrasi dengan data sdm masing masing (sesuai prosedur SMPI)

SIMPRO Cost Control

Tahapan	PIC	Keterangan
Data Umum Proyek	Produksi & RSTI Kantor Pusat	
Bank Data Vendor/Supplier/Subkon/ Mandor	Pengajuan oleh Logistik Wilayah melalui SIMPengadaan	
RAB - RAP	Cost Control Proyek & SEM	
Transaksi	Cost Control Proyek	
Sisa Bahan	Cost Control Proyek	
Progres External	Cost Control Proyek	
Verifikasi data	SEM	
Proses Data	Cost Control Proyek & SOM	
Item Baru & Perubahan	Cost Control & Manager Produksi Wilayah / DIVISI	Proyek menghubungkan wilayah untuk proses ini
Laporan	ALL	

Zona Proyek

- Hal yang perlu diperhatikan :
 - Setiap proyek tidak dibatasi dalam membuat zona proyek
 - Hal yang menjadi pertimbangan dalam membuat zone adalah jenis pekerja, lokasi, dan kompleksitas . Juga terkait pengelolaan logistik /pergudangan di lokasi proyek.
 - Setiap zona proyek mempunyai RAB / RAP / Realisasi Transaksi / dll masing masing
 - Item RAP(A) yang dapat di transaksikan di masing masing zone disesuaikan dengan masing masing RAP zone tersebut.
 - Contoh : ada 2 zone, zone a:Jakarta dengan zone b:lampung, di RAP(A) material semen di zone a: 5000 zak, zone b: 10000 zak. Ketika ada transaksi semen 7000 zak, dia bisa di transaksikan

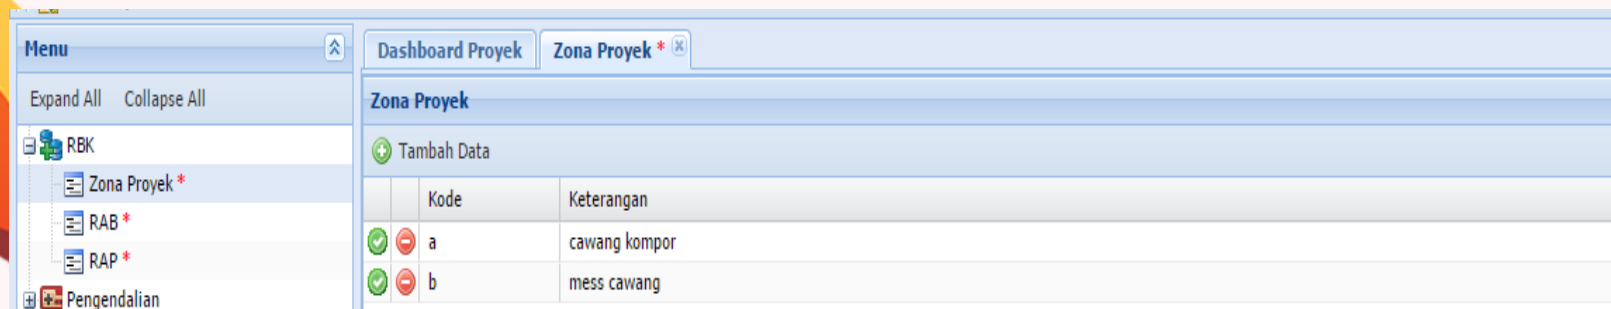

Kode	Keterangan
a	cawang kompor
b	mess cawang

RAB

- Fasilitas lewat excel seperti SIMPRO versi sebelumnya
- Setiap zona mempunyai RAB dan RAP masing masing
- Ada penambahan di harga valas
- Jumlah total RAB seluruh zona tidak boleh melebihi Nilai Kontrak

	A	B	C	D	E	F
	kode	uraian	satuan	vol	harga	harga valas
1	1	Pekerjaan Utama jabor	Ls	1	0	
2	1.1	Pembersihan & Pengukuran	Ls	1	500000	100
3	1.2	Galian & Buangan Tanah	M3	8.17	110000	
4	1.3	Pemadatan Tanah	M2	81.74	13500	
5	1.4	Timbunan Pasir urug 5 cm	M3	4.09	30000	
6	1.5	Coran Lantai Beton 1:2:3	M3	12.26	850000	
7						
8						
9						

RBK

1. Copy Biaya Langsung dari RAB
2. Export excel kemudian insert Biaya Administrasi Umum (BAU) (via excel)
3. Buat analisa (via excel atau via aplikasi)
4. Link analisa dengan item RAP (via excel)
5. Import excel ke RAP

Tahapan Implementasi

No	Tahapan	Kriteria	Bobot	Target
1	Penunjukkan Petugas CC Proyek	Teknik sipil		
1	Data Umum & Bank data vendor / mandor /supplier	Nama, Waktu & Nilai Kontrak harus sesuai	10	10 Hari kalender
2	RAB	Sesuai Kontrak / RAB Kini	20	
3	RAP	Sesuai Penetapan / Current Budget	30	
4	Transaksi real lapangan	Di gelondongkan per item transaksi sd 10 Juli 2016 (sesuai dokumen FM-PBK)	20	7 hari
5	Sisa Bahan	Stock Opname 10 juli 2016	10	2 hari
6	Volume External (Progres)	Pengakuan sd 10 juli 2016	10	1 hari
7	Laporan	Harus sesuai dengan real lapangan		Lap periode genap agustus

Checklist Tahapan Implementasi

No	Proyek	Petugas CC	zone	RAB	RAP	Transa ksi	Sisa Bahan	Vol External
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								



TERIMA KASIH

SIMPengadaan

- Fitur / Spesifikasi
 - Sentralisasi Daftar Rekanan Terseleksi (Vendor, Supplier, Subkon, Mandor)
 - Usulan DRT oleh wilayah dan approval oleh Produksi Pusat
 - Penilaian DRT
 - Bank Data DRT + History penilaian
 - Sistem Pengadaan (Pusat – Wilayah/Divisi – Proyek)
 - Pengajuan Pengadaan
 - Seleksi Pengadaan
 - Pemilihan Pemenang
 - Penilaian Hasil kerja Pemenang
 - Dokumentasi online dalam bentuk pdf (penawaran, BA, PO, BAST)

SIMAsset

- Fitur / Spesifikasi
 - Dashboard Asset Nasional + peta lokasi sebaran asset
 - Bank Data Aset (Tanah, Gedung, Alat Berat, Kendaraan, extracom)
 - Management Alat Berat
 - Perawatan
 - Mutasi Alat
 - Lelang
 - Penyusutan & Kapitalisasi Aset
 - Laporan & Rekap
